

## BITÁCORA DE OBRA

"REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO  
EN LA CALLE EUFRASIO CARRIÓN, EN EL  
MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO."

No. de Contrato:

SAY-OP/AD/12/2021

Monto de la obra:

\$ 1'748,357.67

Inicio de obra:

16 de Mayo de 2021

Término de obra:

31 de Mayo de 2021



Ing. Sergio Cabrera  
Contratista

Ing. Rodrigo Ronce Bernalde  
Residente de obra

Siendo las 09:15 am., al día en curso, se da inicio a la obra "Rehabilitación de superficie de rodamiento en la calle Eufrasio Carreón, en el municipio de Sayula, Jalisco", realizando el trazo y nivelación con equipo topográfico estableciendo ejes, referencias y banco de nivel del terreno para así poder hacer la demolición por medios mecánicos de pavimento de empedrado existente.




Ing. Sergio Cabrera  
Contratista


Ing. Rodrigo Ponce Bernabe  
Residente de Obra

Asentando en esta bitácora al día en curso, se realizaron los trabajos de la demolición por medios mecánicos, la excavación por medios mecánicos en material tipo II y la carga mecánica y acarreo en camión a tiro libre de material tipo producto de la excavación y/o demolición. Acabando esto se comenzará la escarificación del terreno.

Material producto  
de la excavación



Camion de volteo



Ing. Sergio Cabrera  
Contratista

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe  
Presidente de obra


Queda asentado en esta bitacora al día en curso que se concluyeron los trabajos de la escarificación y mejoramiento del terreno natural, formación de la subrazante y comenzando con la base hidráulica con materiales pétreos de 3/4" a finos, compactando al 95% proctor.



Ing. Sergio Cabrera  
Contratista

Ing. Rodrigo Torre Bernabe  
Presidente de obra

Queda asentado en esta bitácora al día en curso que se terminaron los trabajos de suministro y colocación de losa de concreto hidráulico de  $f'c = 250 \text{ Kg/cm}^2$  con acabado rayado y la colocación de machuelos prefabricados rectangular de  $60 \times 20$ ,  $20 \times 15 \text{ cm}$ . Al finalizar se hizo la limpieza general de la obra y se da por terminada la obra: "Rehabilitación de superficie de rodamiento en la calle Eufrasio Carreón, en el municipio de Sayula, Jalisco."

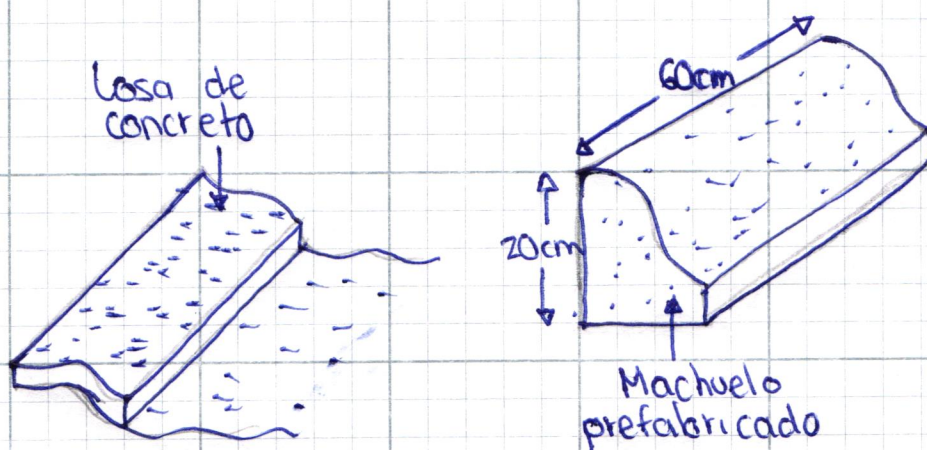

Ing. Sergio Cabrera  
Contratista

Ing. Rodrigo Torre Bernabe  
Residente de obra
