

Nombre de la obra:

"Construcción de Plazoleta del Zalaton, en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco."

No. de Contrato: SAY-OP/AD/03/2021

Monto total de la obra: \$700,000.00

Inicio de obra: 22 de Febrero 2021

Terminación de obra: 02 de Marzo 2021.

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe.

Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.





SAYULA
AYUNTAMIENTO 2018-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Arg. Edgar Alejandro Guevara Puga
Contratista.

Asentando en ésta bitácora al día en curso, siendo las 9:00 am se da inicio con la obra

"Construcción de plazoleta del Zalatlón, en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco", comenzando con los trabajos de trazo y nivelación con equipo topográfico, así como se prosigue a la excavación a mano para machuelo a una profundidad de .30 mts, se retiró el empedrado que se encontraba dentro del área del proyecto.

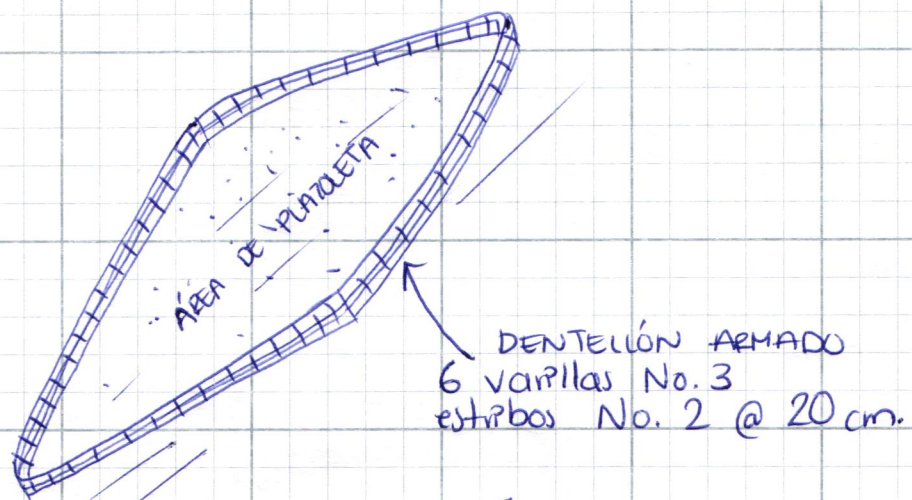

Ara Alejandro Guevara Puga
Contratista.


Ing. Rodrigo Ponce Bernabe.
Dir. Obras Públicas y Desarrollo Urbano.



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Asentando en ésta bitácora al día en curso se retiró el material sobrante de la excavación en camión, posteriormente comienzan los trabajos de la elaboración del dentellón con una sección de 10×35 cm con acero de refuerzo armado con 6 varillas del No. 3, con estribos del No. 2 a cada 20 cm.



Arg. Edgar Alejandro Guevara Puga
Contratista.



SAVILA
AYUNTAMIENTO 2016-2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS

Ing. Rodrigo Ponce Barcibe

Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Asentando en ésta bitácora al día en curso se continúan con los trabajos de relleno en el área de circulación a 20 cm de altura y nivelación del terreno con material producto de la excavación para recibir el concreto.

Arg. Edgar Alejandro Guevara Puga
Contratista.



SAN JUAN DE LOS RIOS
AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS


Ing. Rodrigo Ponce Berndt
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Se continúan los trabajos de la elaboración del piso de concreto estampado de 10 cm de espesor, utilizando concreto $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$ reforzado con malla electrosoldada $6 \times 6 - 10/10$, incluyendo color, moldes, desmoldante, hidrolavadora.


Se aplicarán 2 diferentes estampados y colores, uno al centro de la plazaleta y el otro en el resto y orillas, color terracota y gris.

Arg. Edgar Alejandro Guevara Puga.

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe.
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.




Se continúan con los trabajos del equipamiento,
colección de 4 bancas PREVA MARCA BKT
MMCITÉ - LPU - METAL, BASURERO METÁLICO para espacios
públicos, elaboración de registros para alumbrado
público de $0.40 \times 0.60 \times 0.80$ m con marco galvanizado,
instalación de juego de 4 andas de $3/4"$ de diámetro.


Arq. Edgar Alejandro Guevara Puga
Contratista.



SAYULA
AYUNTAMIENTO 2016 - 2021
DIRECCIÓN
DE OBRAS
PÚBLICAS


Ing. Rodrigo Ponce Bernabe.
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Al día en curso se continúan con los últimos trabajos de la obra, instalación de 4 postes cónicos circulares de 9.00 m de altura, incluye placa base de acero rolado en caliente, aro de refuerzo, se prosigue a la instalación de luminaria antivandálica, modelo ENUR L fabricada a base de polímero técnico, resistente a la corrosión y humedad.

Se elabora Limpieza general de la Obra y se da por terminada la obra "Construcción de Plazuela del Zalatlón, en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco".

Arg. Edgar Alejandro Guevara Puga
Contratista.

Ing. Rodrigo Ponce Bernabe
Dir. de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

